

負荷調整入力

[進捗] - [負荷調整入力]

MRP

製番管理

概要

- 各手配先（または機械）へ指示した予定作業工数と、手配先のキャパシティを比較し、1 日ごとの作業負荷を確認・調整します。
- 調整方法は、「着手予定日／完了予定日の変更」「作業手配先の変更」の 2 種類です。
- 発注伝票（指示書）発行済みデータの調整も可能です。

基本操作

[共通画面]

KEY

対象データ 発注

所要量計算

手配(内作)

表示切替

終了(f-1)

開始日 2025/08/01

工程

OK(f-6)

機械

工数計

8/13

8/14

8/15

8/16

8/17

8/18

8/19

8/20

8/21

8/22

8/23

8/24

8/25

8/26

8/27

8/28

8/29

8/30

8/31

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

(全体計)

251

1002

1002

301

802

557

56

2790

2790

角窓製造機 K-2

202

101

101

ペンター機 B-1

904

251

201

201

射出機 S-35

402

201

201

研磨機 KK-100

602

301

301

プレス機 P-3

502

組立機 KRU-45

27,692

801

801

501

557

56

2488

2488

手配先

工数計

8/13

8/14

8/15

8/16

8/17

8/18

8/19

8/20

8/21

8/22

8/23

8/24

8/25

8/26

8/27

8/28

8/29

8/30

8/31

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

製造6課

7,931

251

101

101

101

101

67

888

989

302

302

101

702

702

101

101

101

402

602

製造7課

602

301

塗装係

1,414

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

加工係

1,308

153

854

501

プレス係

30

15

15

テスト係

3,622

配合係

10,014

1669

1669

1669

1669

1669

1669

製造4課 組立係

15,782

251

251

101

202

202

202

202

1003

1003

403

1655

1510

759

1060

559

953

953

503

製造4課 検査係

10,763

167

167

234

67

201

134

268

668

802

858

458

858

859

803

804

469

469

製造1課 組立係

25,320

2030

2030

630

630

製造1課 検査係

320

160

160

0%

~50%

~80%

~100%

~120%

~150%

過負荷

明細照会

Excel出力

手配(f-2)

OK(f-10)

(1) 【対象データ】【開始日】の指定

- ・表示する負荷（予定作業工数）の種類を選択します。複数チェックが可能です。

【発注】チェック

【発注入力】で登録、または【自動発注更新】で確定した発注データが対象となります。

【所要量計算】チェック

直前に実行した【所要量計算処理】の計算結果が対象となります。

これは【自動発注更新】で確定する前のデータです。

【手配（内作）】チェック

【製番手配入力】で登録した指示データが対象となります。（調達区分：内作）

- ・【開始日】に指定した日付から 3 ヶ月間が表示されます。

（初期値はログイン日付となります。）

(2) 【OK(f・6)】ボタンをクリック

- ・工程コードを指定しない場合、メッセージが表示されます。

【OK】ボタンをクリックします。

- ・各手配先（または機械）に、日単位の予定作業工数が表示されます。
- ・手配先のキャパシティと比較し、作業負荷の大きさを色分けで表します。

（画面左下をご参照ください。）

※ 手配先のキャパシティ＝【手配先別日程マスター保守】で登録した【保有工数】となります。

- ・色分けは【手配先別日程マスター保守】で登録した【保有工数】を手配先のキャパシティとし、それに対し負荷がどの程度の割合なのか、を表しています。

(3) 負荷を調整

- ・【所要量計算処理】は納期基準で日付計算がされるため、手配先のキャパシティは考慮されていません。


そのため、負荷が集中した場合は、実際の運用に合わせて作業工数を調整する必要があります。

負荷調整は、『手配先別』または『製番別』で実施可能です。

これより先は明細画面（手配先別負荷調整）

明細行をダブルクリックして、手配先別の負荷調整画面を表示します。

[明細画面] - [手配先別負荷調整]

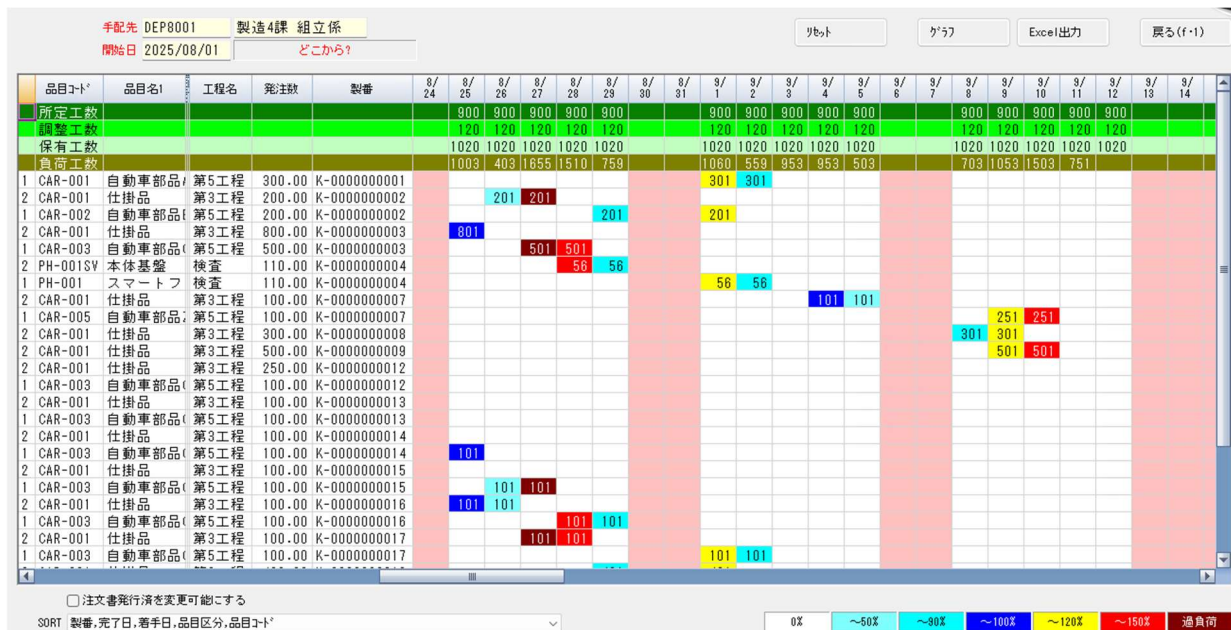

手配先ごとに、作業指示（予定）一覧が表示されます。【グラフ】ボタンをクリックすると、3ヵ月分の負荷工数と保有工数（キャパシティ）のグラフが表示されます。

(1) 着手予定日を変更

- 画面左上の【開始日】右側に「どこから？」と表示されているのを確認し、変更後の着手予定日をクリックします。

※ 着手予定日に変更がない場合は、既存の予定日をクリックします。

※ 既に注文書（指示書）発行済みの工程を調整する場合は、

【注文書発行済みを変更可能にする】チェックを ON にします。

(2) 完了予定日を変更

- 画面左上の【開始日】右側に「どこまで？」と表示されていることを確認し、変更したい工程行の完了予定日をクリックします。
- 「負荷調整入力・製番別画面へ移動しますか？」というメッセージが表示されます。

※ 1 作業工程の着手予定日／完了予定日を調整した場合、前後工程は自動的に連動しないため、注意が必要です。続けて前後工程を確認・調整する場合は、【はい】を選択します。

これより先は明細画面（製番別負荷調整）

[手配先別負荷調整]画面の各工程行をダブルクリックし、製番別明細画面を表示します。

[明細画面] - [製番別負荷調整]

製番 K-0000000003 品目コード 1 CAR-003 完了予定日 2025/09/03
 関連製番 品目名1 自動車部品C 納期 2025/09/03
 得意先 品目名2 製番伝票発行

品目コード	品目名1	品目名2	工程名	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4
2 CAR-001	仕掛品	〈製品B・C・D〉	第1工程	801	801														
2 CAR-001	仕掛品	〈製品B・C・D〉	第2工程		801	801													
2 CAR-001	仕掛品	〈製品B・C・D〉	第3工程			801			801										
2 CAR-001	仕掛品	〈製品B・C・D〉	第4工程						534	534	534								
1 CAR-003	自動車部品C		第5工程								501	501							
1 CAR-003	自動車部品C		第6工程									501	501						
1 CAR-003	自動車部品C		第7工程										334			334			
1 CAR-003	自動車部品C		塗装														501	501	

再表示(f-5) スライド日数 0 実行 調整 どこから? リセット Excel出力 キャンセル(f-2) OK(f-10)

パターン1（製番一括）

（1）製番全体の作業予定をスライド

パターン2（1工程ごと）

（1）作業開始日を変更

- ・画面下中央に「どこから?」と表示されていることを確認し、作業日を変更したい工程行の作業開始希望日をクリックします。

（2）作業納期を変更

- ・画面下中央に「どこまで?」と表示されていることを確認し、変更したい工程行の納期希望日をクリックします。

（3）【OK(f-10)】ボタンをクリック

- ・変更内容は前画面の[手配先別負荷調整]にも反映されます。
- ・この時点では変更データは更新されていません。

作業（発注）の手配先は、他部署や外注先に変更可能です。

[手配先別負荷調整] の明細行を右クリックします。

[手配先変更画面]

製番	K-0000000003	自動車部品C	着手日	2025/08/27
品目区分	1 製品	自動車部品C	完了日	2025/08/28
品目コード	CAR-003		構成ID	
工程	CAR-005	第5工程	手配ID	

変更前

手配先	DEP8001	製造4課 組立係	支給照会
機械	K-006	組立機	

変更後

手配先	DEP1004	製造4課
機械	K-006	組立機 K KU-45

変更先負荷状況参照

対象が 発注 ☐ 所要量計算 ☐ 手配(内作) ☐

	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5
所定工数	930	930	930	930	930			930	930	930	930	930			930	930	930	930	930
調整工数	120	120	120	120	120			120	120	120	120	120			120	120	120	120	120
保有工数	1050	1050	1050	1050	1050			1050	1050	1050	1050	1050			1050	1050	1050	1050	1050
負荷工数									301	301									
変更後負荷工数									301	802	501								

0% ~50% ~90% ~100% ~120% ~150% 過負荷

キャンセル(f・2) OK(f・10)

(1) 変更後の【手配先】を入力

- 作業を振り替える先の部署（機械）または外注先を入力します。

(2) 【変更先負荷状況参照】 ボタンをクリック

- 変更後の【手配先】の負荷状況を確認します。

(3) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- この時点では変更データはまだ更新されていません。

共通画面へ戻る

【OK(f・10)】 ボタンをクリックします。

調整を行ったデータが確定します。

<補足>

■ 初期表示

本画面を開いたときの初期表示を、【手配先】とするか【機械】とするか、設定可能です。

〔コントロールマスター保守〕(KEY:1400 旧項目名:負荷調整機械優先 F)

チェック OFF=初期表示：手配先／チェック ON=初期表示：機械

■ 着手予定日の変更

〔コントロールマスター保守〕(KEY:1780 旧項目名:手配確発注日手配 F) が

チェック OFF の場合、着手予定日は変更不可となります。(完了予定日は変更可能です。)

■ 負荷の単位

〔品目構成マスター保守〕／〔手配先別日程マスター保守〕／〔機械別日程マスター保守〕の単位(時間／分／秒)を合わせておく必要があります。

■ 1 日当たりの負荷工数の計算式

①データ発生元が発注データの場合

$(\text{段取工数} + (\text{加工工数} \times \text{発注数})) \div \text{作業日数}$

②データ発生元が所要量計算データの場合

$(\text{段取時間} + (\text{作業時間} \div \text{取り数} \times \text{加工回数}) \times \text{手配数}) \div \text{作業日数}$

③データ発生元が手配データの場合

$(\text{段取工数} + \text{加工工数}) \div \text{作業日数}$

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2017/12/27	R3.0.00	初版を発行。
2018/12/28	R4.0.00	初版を発行。
2022/06/30 (第 2～3 版)	R3.0.00	軽微な文言修正。 画面サンプルを差し替え。
2023/06/30 (第 4 版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。 ※版の表示は、R3.0 に合わせて第 4 版とする。
		画面サンプル（手配先変更画面）を差し替え。
2026/03/31 (第 5 版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。
